



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 04

Área de Supervisión y Gestión del
Servicio Educativo

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 2018 al 2027"

COMAS, 28 JUN. 2018

OFICIO MÚLTIPLE N° 102-2018 -MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL04/ASGESE-ESIE

Señor (a) (ta):
Director(a) de la Institución Educativa

Presente. -

ASUNTO : SOLICITO REPORTE DEL ESTADO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS.

REFERENCIA : a) ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
DAR ATENCIÓN CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PROVISIONALES.

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para saludarlo muy cordialmente en nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 y de acuerdo a las facultades conferidas y lo establecido en la Resolución Directoral N°04-2018 UGEL N°04, hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que habiendo tomado conocimiento de la existencia de módulos prefabricados de servicios higiénicos que cuenta PRONIED disponible para la entrega bajo algunos requisitos, remito a su despacho el ANEXO 3 "ficha técnica de evaluación de infraestructura para dar atención con servicios higiénicos provisionales", que debe ser llenado en caso de existir la necesidad de servicio higiénico y principalmente la disponibilidad de espacio 9mx10m que corresponde a 90m², además se pone de conocimiento que para cualquier duda con respecto al llenado del Anexo 3 ponerse en contacto con el teléfono móvil 991041255 Arq. Amiel López Dávalos. Una vez llenado el Anexo 3, visar todas las hojas, posteriormente escanear y enviar al correo electrónico amiel_polux@hotmail.com, además enviar las siguientes fotos:

- Fotos del área en donde se pretende instalar los baños
- Fotos de los baños existentes

Sin Otro en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



NRE/LASGESE
LAM/Coord.(e) ESIE-ASGESE
AID/Tec. Infraestructura - ESSE



Lic. NANCY RUIZ HIDALGO

Jefa (e) del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo
UGEL N° 04



PERÚ

Ministerio
de Educación

ANEXO 3

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DAR ATENCIÓN CON SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES:

(Llenar este formato solo en caso de necesitar módulos prefabricados de baños)

MODULOS PREFABRICADOS DE BAÑOS VERIFICACIONES DE CAMPO


LAS PRESENTES VERIFICACIONES SE ENCUENTRAN ENMARCADAS EN LA DOTACION DE BAÑOS PREFABRICADOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN ZONAS DE COSTA Y SIERRA

DEL TERRENO

1. VERIFICAR: ¿CUÁNTOS METROS CUADRADOS TIENE EL TERRENO? INDICAR MEDIDAS DEL TERRENO EN METROS, EN CASO DE SER UN TERRENO IRREGULAR, INDICAR LA MEDIDA DE TODOS SUS LADOS (ANEXAR CROQUIS).
2. VERIFICAR SI EXISTEN CONSTRUCCIONES EN EL TERRENO E INCLUIRLAS EN EL CROQUIS (INDICAR SUS MEDIDAS EN METROS).
3. VERIFICAR SI EXISTE AREA DISPONIBLE PARA INSTALAR MODULOS PREFABRICADOS SIN NECESIDAD DE DEMOLER LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL, ¿Cuántos METROS CUADRADOS DISPONIBLES HAY? ¿DONDE PODRIAN SER UBICADOS LOS MODULOS?

COMO REFERENCIA EL AREA DE UN MODULO ES DE 105 M2 (AREA DE OCUPACION). EL AREA DE OCUPACION DE UN MODULO ES:
LARGO = 10 M ANCHO = 9M.

10

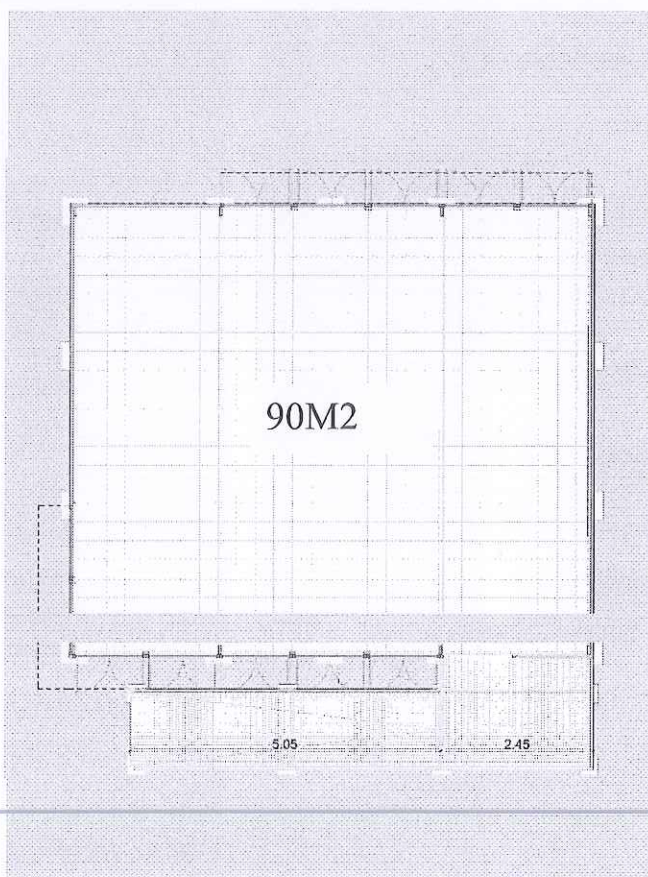

9





PERÚ

Ministerio
de Educación

ANEXO 3

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DAR ATENCIÓN CON SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES:

4. DE VERIFICARSE QUE EL TERRENO NO CUENTA CON AREA SUFICIENTE PARA INSTALAR MODULOS, ¿PUEDE LA COMUNIDAD DONAR ÁREA NECESARIA PARA INSTALAR LOS MODULOS? (NO ES POSIBLE UNA DEMOLICIÓN POR PARTE DEL PRONIED). DE CONSEGUIR UN NUEVO TERRENO REPETIR LAS VERIFICACIONES E INDICAR ¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DEL TERRENO ORIGINAL?
5. VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL AREA DISPONIBLE. INDICAR SI ES UN TERRENO NATURAL O UNA LOSA U OTRO TIPO DE TERRENO. INDICAR LA FORMA DEL TERRENO Y REFLEJARLA EN EL CROQUIS. INDICAR SI EL TERRENO PRESENTA DESNIVELES PRONUNCIADOS. POR EJEMPLO, NO DEBERÁ TENER DESNIVELES MAYORES A 20 CM DE UN EXTREMO A OTRO.
6. VERIFICAR QUE EL ÁREA DISPONIBLE NO ESTÉ CERCA A INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO. LA DISTANCIA MINIMA DE UN MODULO A ESTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEBERA SER DE 3.50 M.
7. VERIFICAR LA PROPIEDAD DEL TERRENO E INCLUIR COPIA DEL TÍTULO DE PROPIEDAD. VERIFICAR SI EXISTEN PROBLEMAS LEGALES RELACIONADOS AL TERRENO (INVASIONES U OTRO TIPO).
8. INDICAR CLARAMENTE LA CANTIDAD DE MODULOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS EN EL TERRENO, CONSIDERANDO EL AREA DISPONIBLE CON QUE SE CUENTA.

DE LA INFRAESTRUCTURA

9. VERIFICAR: ¿CON CUANTAS EDIFICACIONES CUENTA LA INSTITUCION EDUCATIVA? INCLUIR ESTAS EDIFICACIONES EN EL CROQUIS.
10. VERIFICAR: ¿CUÁLES SON LOS MATERIALES PREDOMINANTES UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE?
11. VERIFICAR: ¿CON CUANTOS AMBIENTES CUENTA LA INSTITUCION EDUCATIVA? ENUMERAR LOS AMBIENTES Y SU USO.
12. VERIFICAR: ¿CÓMO HA SIDO AFECTADA LA INSTITUCION EDUCATIVA? ¿CUANTOS AMBIENTES HAN SIDO AFECTADOS? ¿QUÉ COMPONENTES POR CADA AMBIENTE HAN SIDO AFECTADOS? (EJEMPLO: TECHOS, MUROS, ESTRUCTURAS DEL AMBIENTE AULA 1).
13. VERIFICAR EL TIPO DE SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL TERRENO Y CONSIGNARLO EN LA FICHA. LOS SERVICIOS BASICOS SON: ¿CUENTA CON RED PÚBLICA DE AGUA? CUENTA CON RED PÚBLICA DE DESAGUE? ¿CUENTA CON CONEXIÓN A LA ENERGÍA ELECTRICA?

DE LOS ACCESOS

14. VERIFICAR EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO, INDICAR CLARAMENTE SI SE LLEGA POR TROCHA O CARRETERA U OTROS Y LOS TIEMPOS DE LLEGADA.
15. DE PREFERENCIA DIBUJAR UN CROQUIS DE COMO SE ACCEDE AL CENTRO EDUCATIVO.

DEL LLENADO DE LA FICHA

16. COMPLETAR **TODOS LOS DATOS** DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (NOMBRE, CODIGO MODULAR, NIVEL EDUCATIVO, DIRECCION (CALLE, DISTRITO, PROVINCIA, CENTRO POBLADO), NOMBRE DEL DIRECTOR, CONTACTO DEL DIRECTOR).
17. DE EXISTIR VARIOS NIVELES EDUCATIVOS (INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA) EN CENTRO EDUCATIVO AFECTADO, PRECISAR A CUALES DE ESTOS NIVELES SE LES ATENDERA CON MODULOS.
18. EL CROQUIS DEBE IR DENTRO DEL ANEXO 3 Y DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS INDICACIONES.
19. FIRMAR LA FICHA DE INSPECCION POR LA PERSONA QUE REALIZA LA VISITA. ASIMISMO, CONSIGNAR LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA I.I.E.E O QUIEN HAGA SUS VECES.





PERÚ

Ministerio
de Educación

ANEXO 3

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
DAR ATENCIÓN CON SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES:

INSPECCION A LA INSTITUCION EDUCATIVA

I.E.

DIRECCION :

Centro Poblado:

Distrito: Provincia: Region:

CODIGO MODULAR : CODIGO DE LOCAL :

NIVEL EDUCATIVO : Inicial: ☐ Primaria: ☐ Secundaria: ☐

POBLACIÓN ESCOLAR : Alumnos

FECHA DE INSPECCION : día:, mes:, Año:

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:

Nombre del Director :

Teléfono: Correo Electrónico:

NIVEL EDUCATIVO	Nº DE ALUMNOS		TURNO DE FUNCIONAMIENTO		Nº SECCIONES EXISTENTES	
	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE
INICIAL						
PRIMARIA						
SECUNDARIA						

Área del Terreno : M2, Dimensiones del Terreno:

Altitud del Terreno : msnm, Clima:, Otros:

1. DATOS DEL TERRENO:

- Acceso al terreno: Asfaltado () Afirmado () Trocha () Carrozable ()
- Acceso Interrumpido: Sí () (detallar) NO ()
.....
- Pendiente del Terreno:, Acceso a discapacitados (Rampas):
- Tipo de Suelo: Rocoso () Arena () Arcilla () Otros ()
.....
- Zona Inundable: No () SI () por: Lluvia () Desborde de Río ()
Desborde de Canal o Acequia () Otros ()
- Indicar si está ubicado a cercanías de (río, ladera de cerro, acequias, botadero de basura, líneas de alta tensión, relleno sanitario, otros.):





PERÚ

Ministerio
de Educación**ANEXO 3****FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
DAR ATENCIÓN CON SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES:****2. SERVICIOS BÁSICOS:****2.1. ENERGÍA ELÉCTRICA**

Red Pública Sí () NO () Funciona Sí () NO ()

Forma de Suministro Monofásico () Trifásico () 220V () 380/220V ()

Abastecimiento 24 Horas () 12 Horas () Horario de: _____ a: _____

2.2. AGUA

Red Pública Sí () NO () Funciona Sí () NO ()

Tanque Cisterna Sí () NO () Pozo Propio Sí () NO () Camión Cisterna Sí () NO ()

Otros _____

N° de Horas de Abastecimiento/Día _____ Horario de: _____ a: _____

Distancia aproximada del punto de agua más cercano a la ubicación del módulo prefabricado de SS.HH.....

2.3. DESAGUE

Red Pública Sí () NO (), Funciona Sí () NO () Tanque Biodigestor Sí () NO ()

Pozo Séptico Sí () NO () Pozo Percolador Sí () NO () Zanja Filtrante Sí () NO ()

Otros _____

Distancia aproximada del punto de desagüe más cercano a la ubicación del módulo prefabricado de
SS.HH.....**3. NECESIDAD DE TRABAJOS PREVIOS: SI () NO ()**

Descripción de los trabajos a realizar:

4. NECESIDAD DE SSHH: Requiere: Servicios Higiénicos

Disponibilidad de espacio para la instalación de módulos prefabricados de servicios higiénicos: SI () NO ()

Descripción del Lugar donde se va a instalar los Servicios Higiénicos provisionales (debe de ser adecuado y no
tugurizar los espacios libres y no afectar zonas de concentración en caso de sismos).Otras descripciones adicionales (relevantes que influyan en la instalación de los servicios higiénicos
prefabricadas):



PERÚ

Ministerio
de Educación**ANEXO 3****FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
DAR ATENCIÓN CON SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES:****5. EVALUACIÓN DE MODULOS PREFABRICADOS DE SSHH EXISTENTES:**

Cantidad de Módulos: Servicios Higiénicos

Año de Instalación:

Entidad que Entrego..... Estado de Conservación:

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS HIGIENICOS		ESTADO
SSHH	Estructura	
# Niveles		
SSHH 1: Inic. () Prim. () Sec. ()	Muros :	Estado de la Estructura (Muros, Columnas, Vigas, Techo y Piso):
Hombres: I.() C.() U.() D.()		
Mujeres : I.() C.() U.() D.()	Columnas :	
SSHH 2: Inic. () Prim. () Sec. ()		Estado de las Instalaciones (sanitarias y eléctricas):
Hombres: I.() C.() U.() D.()	Viguetas :	
Mujeres : I.() C.() U.() D.()		
SSHH 3: Inic. () Prim. () Sec. ()	Cobertura :	Entidad que la Construyo:
Hombres: I.() C.() U.() D.()		
Mujeres : I.() C.() U.() D.()	Pisos :	
SSHH 4: Inic. () Prim. () Sec. ()	Puertas:	Año de Construcción:
Hombres: I.() C.() U.() D.()	Ventanas:	
Mujeres : I.() C.() U.() D.()		

* I: # Inodoros, C: # Caños, U: # Urinarios, D: # duchas

7. SEGURIDAD PARA LA CUSTODIA DE LOS SS.HH. PROVISIONALES:

Cuenta con vigilancia: NO () SI ()

Cuenta con cerco perimétrico: NO () SI () Material:

Firman en señal de Conformidad:

Nombre del Evaluador

Sello y Firma del Evaluador (CAP/CIP)

Teléfono / Correo

Nombre del Director de la I.E.

Sello y Firma del Director

Teléfono / Correo





PERÚ

Ministerio
de Educación

ANEXO 3

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DAR ATENCIÓN CON SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES:

8. CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO

Graficar croquis del local educativo, indicando la ubicación del terreno disponible para la instalación del módulo prefabricado. Este plano deberá estar acotado, se deberá dibujar los linderos, así como la posición del módulo prefabricado y la ubicación de la rampa, se deberá indicar el ingreso principal del local educativo y las construcciones existentes. Asimismo, señalar las medidas del terreno disponible.
